



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

I N F O R M A C E

pro schůzi rady města dne 19.09.2017

Informace o plnění IPRÚ

Předkládá: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Zpracoval: Steinzová Barbara, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Důvodová zpráva

Manažer IPRÚ předkládá informaci o realizaci Integrovaného plánu rozvoje území, včetně přehledu projektů schválených Řídicím výborem IPRÚ a aktuálního stavu projektů IPRÚ statutárního města Liberec.

Přílohy

Zpráva_IPRU_2017_ZM



**Informace o plnění
Integrovaného plánu rozvoje
území
Liberec – Jablonec nad Nisou**

Září 2017

Informace o plnění integrované strategie IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

První výzvy IPRÚ byly vyhlášeny na konci roku 2016, zatím proběhlo 10 výzev s alokací 1 400 mil. Kč (z toho 827 mil. Kč na tramvajové tratě). Řídicí výbor IPRÚ schválil 21 projektových záměrů a do dalšího procesu hodnocení na jednotlivé řídicí orgány bylo předloženo již 17 projektů za cca 860 mil. Kč, z toho 4 projekty v hodnotě 45 mil. Kč byly již schváleny Řídicím orgánem OP Zaměstnanost a bylo jim vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Tímto aktem se IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou dostalo do stavu realizace a čerpání jako první IPRÚ. Spolu s Českými Budějovicemi patříme také mezi první v počtu podaných žádostí o podporu v rámci IPRÚ. Některé projekty jsou již ve faktické realizaci bez zatím schválených žádostí (např. rekonstrukce tramvajové trati, nákup autobusů, navýšení kapacit MŠ).

Během druhé poloviny 2017 budou vyhlášeny další výzvy na sociální infrastrukturu, udržitelnou mobilitu a vzdělávání v objemu 450 mil. Kč.

Většina projektů IPRÚ bude připravena do poloviny roku 2018. V roce 2017 se budou čerpat pouze prostředky OP Zaměstnanost a OP Doprava, u IROP se vzhledem k více než půlroční délce hodnocení jednotlivých projektů počítá s posunem čerpání do roku 2018. Z tohoto důvodu bude do říjnového ZM předkládána změna IPRÚ s posunutím finančního plánu. V některých oblastech se očekává rychlejší čerpání oproti finančnímu plánu (např. oblast vzdělávání a sociální infrastruktury), v oblasti dopravní infrastruktury bude čerpání rozloženo do dalších let vzhledem k náročným projektům na Terminály. Města IPRÚ postupují koordinovaně a vzájemně se budou v čerpání doplňovat tak, aby jako celek naplnily čerpání a indikátory stanovené IROP. Nemělo by tedy dojít ke krácení alokace v případě opožděného čerpání.

Přehled projektů IPRÚ schválených ŘV IPRÚ

Výzva	Oblast	Priorita OP	Projekty schválené Řídicím výborem IPRÚ	Žadatel
1	Zaměstnanost	OPZ 1.1.1	3K pro praxi JobPoint Mezi horami Hladce do práce Lepší šance pro trh práce	TULIPAN Centrum Kašpar Centrum Kašpar Pomocné ruce
2	Tramvajové tratě	OPD 1.4	Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova Rekonstrukce TT LBC – JBC – 7 etap	DPMLJ
3	Nízkoemisní vozidla	IROP 1.2	Nákup 17 nízkoemisních busů	DPMLJ
4	Terminály	IROP 1.2	---	---
5	Sociální podniky	IROP 2.2	Prádelna DUHA	Aktivní život
6	Sociální začleňování	OPZ 2.1.1	Sociální informační centrum	SML
7	Mateřské školy	IROP 2.4	MŠ Nová Ruda MŠ Beruška (v procesu schvalování)	MO Vratislavice SML
8	Základní školy	IROP 2.4	ZŠ Kaplického ZŠ Nám. Míru ZŠ Vratislavice ZŠ Liberecká + ZŠ Mozartova	SML SML MO Vratislavice SMJNN
9	Sociální podniky II	IROP 2.2	Výroba interaktivních exponátů	IQLANDIA servis
10	Sociální infrastruktura	IROP 2.1	Výzva probíhá	Obce, NNO

Specifický cíl 1 Zlepšení mobility (dopravní dostupnosti a obslužnosti) území

Opatření: 1.1 Regionální silniční síť


Celková alokace: IROP 182 500 000 Kč

Výzvy: Výzva ještě nebyla vyhlášena, T: 11/2017

Žadatel: Kraj

Předložené projekty: Předpoklad 2 projekty 12/2017 a 05/2018 v objemu celé alokace

Problematické oblasti: zdlouhavá příprava projektových dokumentací

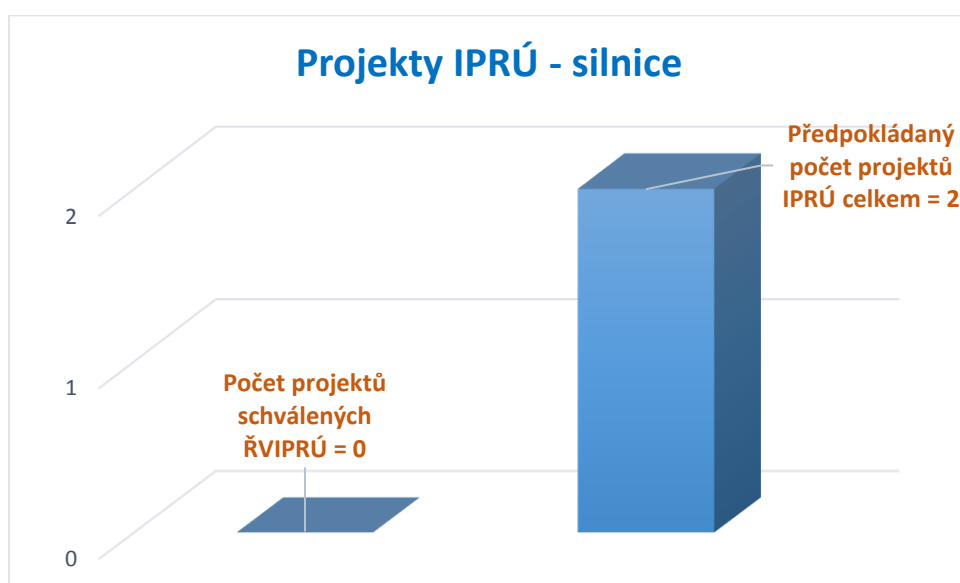

Opatření: 1.2 Rozvoj tramvajových tratí


Celková alokace: OPD 827 700 000 Kč

Výzvy: Výzva průběžná

Žadatel: DPMLJ

Předložené projekty: Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova - 62 mil. Kč, 7 etap rekonstrukce TT Liberec – Jablonec nad Nisou v objemu 585 mil. Kč

Problematické oblasti: bez problémů

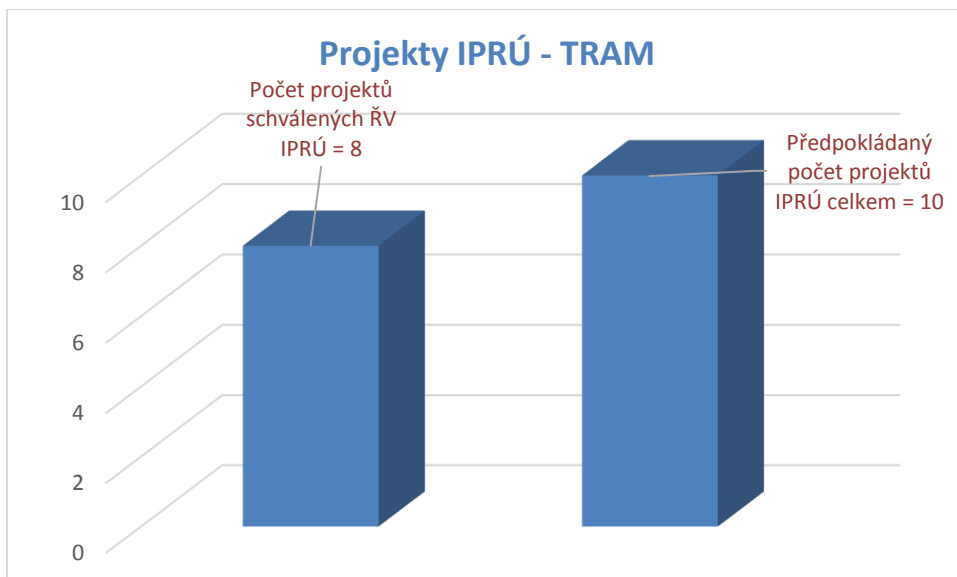

Specifický cíl 2 Navýšení podílu udržitelných forem dopravy v území

Opatření 2.1 Zlepšení podmínek pro účastníky mobility


Celková alokace: IROP 372 990 000 Kč

Výzvy: Výzva proběhla, další 09/2017

Žadatel: SML, SMJNN, obce

Předložené projekty: Předpoklad 2 projekty 09/2017

Problematické oblasti: dlouhá příprava projektových dokumentací 2 velkých projektů na terminály, nutnost posunutí finančního plánu, předpoklad předložení žádosti na Terminál LBC – 1Q/2018, Terminál JBC až po roce 2019

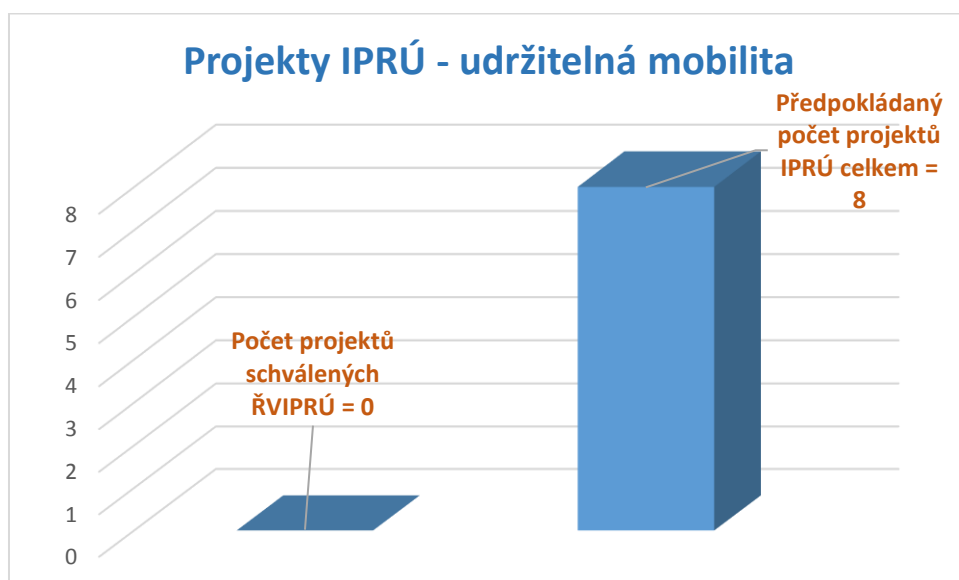

Opatření 2.2 Eliminace negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví

Celková alokace: IROP 94 010 000 Kč


Výzvy: Výzva proběhla

Žadatel: DPMLJ


Předložené projekty: Nákup nízkoemisních busů v objemu 98% celé alokace

Problematické oblasti: bez problémů

Projekty IPRÚ - nízkoemisní busy



STAV ALOKACE - UDRŽITELNÁ MOBILITA

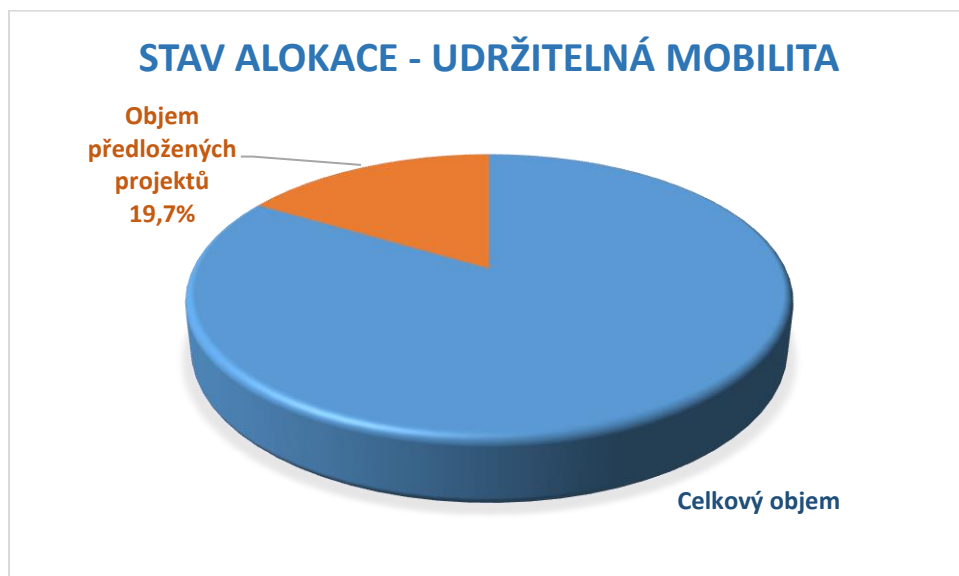

Specifický cíl 3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb

Opatření 3.1 Podpora sociálních služeb a navazující činnosti


Celková alokace: OPZ 17 000 000 Kč

Výzvy: Výzva proběhla, další 06/2018

Žadatel: SML, NNO

Předložené projekty: Sociální informační centrum Liberec, Komunitní centrum Tulipan

Problematické oblasti: projekty navázané na investiční akce z IROP

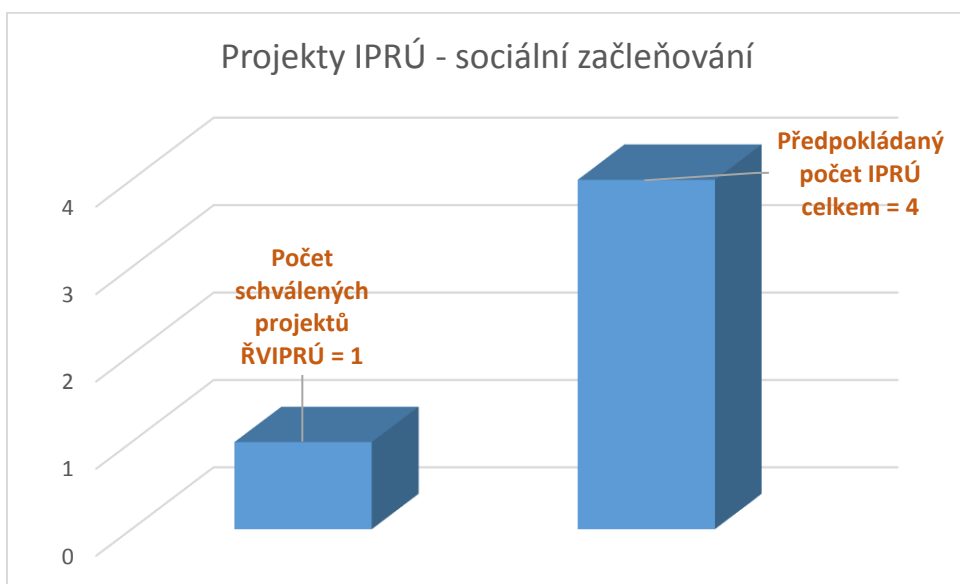

Opatření 3.2 Rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení


Celková alokace: IROP 554 880 000 Kč

Výzvy: Výzva 08/2017

Žadatel: SML, SMJNN, obce, NNO

Předložené projekty: Předpoklad 8 projektů v objemu 190 mil. Kč do 10/2017

Problematické oblasti: malé administrativní kapacity externích zpracovatelů projektových dokumentací

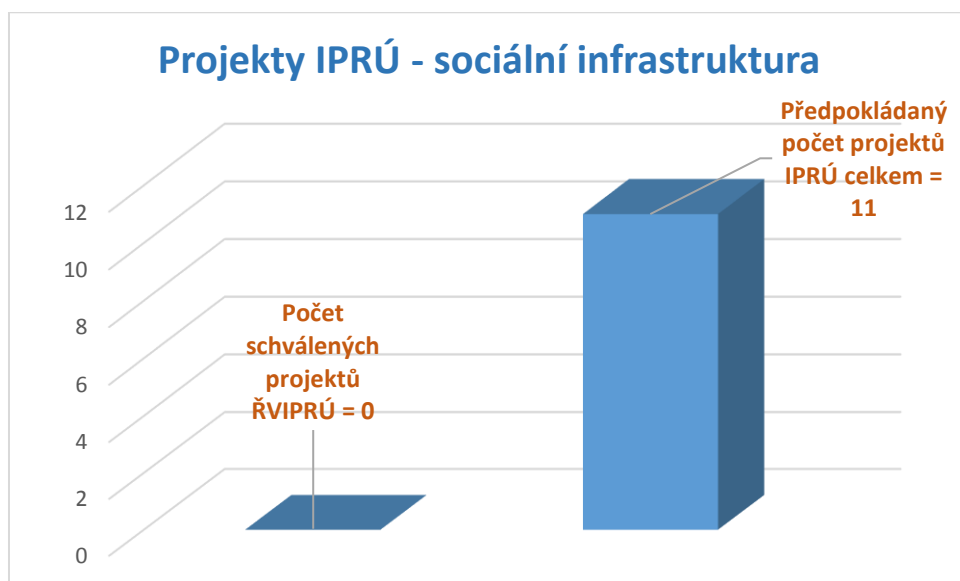

Specifický cíl 4 Zaměstnanost pro podporu sociální soudržnosti

Opatření 4.1: Zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnavatele


Celková alokace: OPZ 102 000 000 Kč

Výzvy: Výzva proběhla, další 08/2018

Žadatel: NNO

Předložené projekty: Předloženy 4 projekty v objemu 46 mil. Kč, již Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Centrum Kašpar – Hladce do práce, JobPoint mezi horami, TULIPAN – 3K pro praxi, Pomocné ruce – Šance pro trh práce

Problematické oblasti: bez problémů

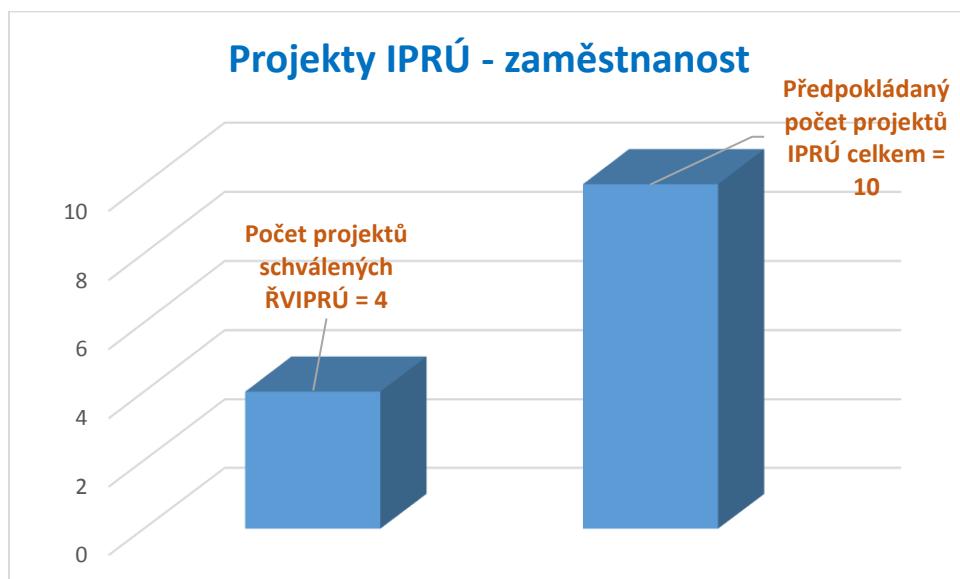

Opatření 4.2 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání


Celková alokace: IROP 26 000 000 Kč

Výzvy: 2 výzvy ukončeny, další 09/2017

Žadatel: NNO

Předložené projekty: Předloženy 2 projekty v objemu 2,2 mil. Kč – Prádelna DUHA, IQLANDIA servis,

Problematické oblasti: relativně menší projekty, které zřejmě nenaplní alokaci, malý zájem žadatelů z důvodu velké administrativní náročnosti, případně nepochopení principu sociálního podnikání

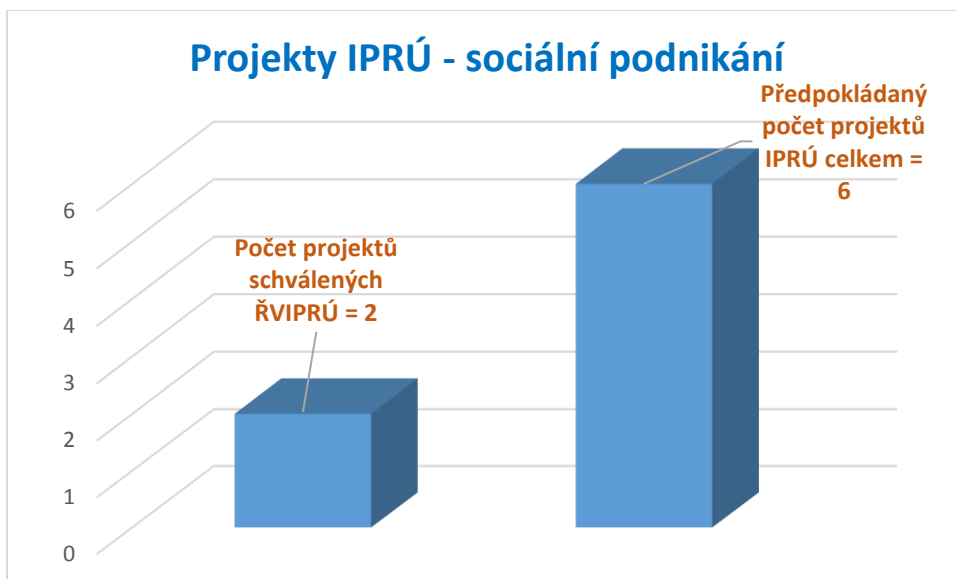

Specifický cíl 5 Optimalizace infrastruktury pro vzdělávání

Opatření 5.1 Optimalizace kapacit, zkvalitnění infrastruktury a vybavení vzdělávacích zařízení

Celková alokace: IROP 416 700 000 Kč

Výzvy: 2 výzvy ukončeny, další 11/2017

Žadatel: SML, SMJNN, obce, kraj

Předložené projekty: Předloženo 6 projektů v objemu 200 mil. Kč – MŠ Nová Ruda, MŠ Beruška, ZŠ Kaplického, ZŠ Nám. Míru, ZŠ Vratislavice, ZŠ Jablonec

Problematické oblasti: navyšování rozpočtů oproti původním předpokladům



Přehled stavu projektů SML v rámci IPRÚ

Projekt	Priorita OP	Alokace (CZV)	Aktuální stav
Sociální informační centrum	OPZ 2.1.1	4 mil. Kč	Ve schvalovacím procesu OPZ
ZŠ Kaplického	IROP 2.4	19,4 mil. Kč	Ve schvalovacím procesu IROP
ZŠ Nám. Míru	IROP 2.4	37,9 mil. Kč	Před podáním žádosti, schváleno ŘV IPRÚ
MŠ Beruška	IROP 2.4	49 mil. Kč	Před podáním žádosti a schválením ŘV IPRÚ
Sociální bydlení 1. etapa	IROP 2.1	20 mil. Kč	Příprava žádosti o podporu, předpoklad podání 11/2017
Azylový dům	IROP 2.1	13 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace, předpoklad podání žádosti 12/2017
Cyklostezka za ČOV	IROP 1.2	14 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace, předpoklad podání žádosti 01/2018
Terminál a parkovací dům	IROP 1.2	130 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace, předpoklad podání žádosti 03/2018
CAŽ - Galerie	IROP 2.1	180 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace, předpoklad podání žádosti 05/2018
MŠ Pastelka, Motýlek ZŠ 5. května	IROP 2.4	50 mil. Kč	Příprava projektové dokumentace, předpoklad podání žádosti 05/2018

Přehled vyhlášených výzev IPRÚ s použitím údajů k 31. 7. 2017

1	Zaměstnanost	OPZ 1.1.1	8.12. – 20.1.2017	80 mil. Kč	Předloženy 4 projekty za 46 mil. Kč do výzvy 046 OPZ – schváleny, příprava Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2	Tramvajové tratě	OPD 1.4	30.1. – 30.9. 2017 průběžná	827 mil. Kč	Předložen 8 projektů za 647 mil. Kč do výzvy 27 OPD – v hodnocení
3	Nízkoemisní vozidla	IROP 1.2	7.2. – 22.2. 2017	94 mil. Kč	Předložen 1 projekt za 92 mil. Kč do výzvy 51 IROP – v hodnocení
4	Terminály	IROP 1.2	6.3. – 12.4. 2017	5 mil. Kč	Výzva se bude opakovat, nebyl předložen žádný projekt
5	Sociální podniky	IROP 2.2	6.3. – 7.4. 2017	13 mil. Kč	Předložen 1 projekt za 640 tis. Kč do výzvy 64 IROP – v hodnocení
6	Sociální začleňování	OPZ 2.1.1	5.4. – 15.5. 2017	10 mil. Kč	Předloženy 2 projekty za 10 mil. Kč
7	Mateřské školy	IROP 2.4	5.5. – 16.6. 2017	80 mil. Kč	Předloženy 2 projekty za 100 mil. Kč
8	Základní školy	IROP 2.4	12.5. – 26.6. 2017	117 mil. Kč	Předloženy 4 projekty za 101 mil. Kč
9	Sociální podniky II	IROP 2.2	19.5. – 16.6. 2017	13 mil. Kč	Předložen 1 projekt za 1,5 mil. Kč
10	Sociální infrastruktura	IROP 2.1	7.8. – 13.1. 2018 průběžná	160 mil. Kč	Předpoklad naplnění celé výzvy
